



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

Email: arquivo@alra.pt

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa a
Presidente da Assembleia
Legislativa da R.A.A.
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		SRAPAP – Sai 270/2014		20-11-2014

ASSUNTO: REQUERIMENTO N. 332/X – REORDENAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DA CASA NO CORVO

Exmo. Senhor

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pelo Senhor Deputado Paulo Estêvão da Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. a Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar relativamente às questões colocadas o seguinte:

1 – Por deliberação do Conselho de Administração da Portos dos Açores, S.A., de 5 de setembro de 2013, foi adjudicada à empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, SA, a elaboração do projeto de “Prolongamento do Molhe-Cais e ampliação da Plataforma do Porto da Casa na Ilha do Corvo”, pelo valor 138.500,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

2 – A proposta adjudicada prevê quatro fases de execução do contrato, com o seguinte plano de pagamentos:

10%, com a aprovação do Programa Base ou 30 dias após a sua entrega;

30%, com a aprovação do anteprojecto ou 30 dias após a sua entrega;

45%, com a aprovação do projeto de execução ou 30 dias após a sua entrega;

15%, durante a assistência técnica, em prestações trimestrais.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Gabinete da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares

3 – Já foram executadas as duas primeiras fases, prevendo-se que a entrega do projeto de execução (3.ª fase) ocorra até o final do corrente mês de novembro. Em consequência, já foram emitidas as faturas das 1.ª e 2ª fases, no valor global de 55.400,00€ + IVA (40% do valor da proposta adjudicada).

4 – Para o início dos estudos que levaram ao programa base foi necessário efetuar o levantamento topo-hidrográfico da baía do porto da casa, o qual foi executado com meios internos da Portos dos Açores, SA.

5 – Anexa-se um planta geral do projetado até à data.

Com os melhores cumprimentos, *e considerações*

A CHEFE DO GABINETE,

Rafaela Seabra Teixeira


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <u>3370</u>	Proc. n.º <u>54.07.09</u>
Data: <u>014 / 11 / 20</u>	N.º <u>332 / X</u>

Anexo


GOVERNO DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES

**PROLONGAMENTO DO MOLHE CAIS E ALARGAMENTO DA PLATAFORMA DO PORTO DA CASA
ILHA DO CORVO**

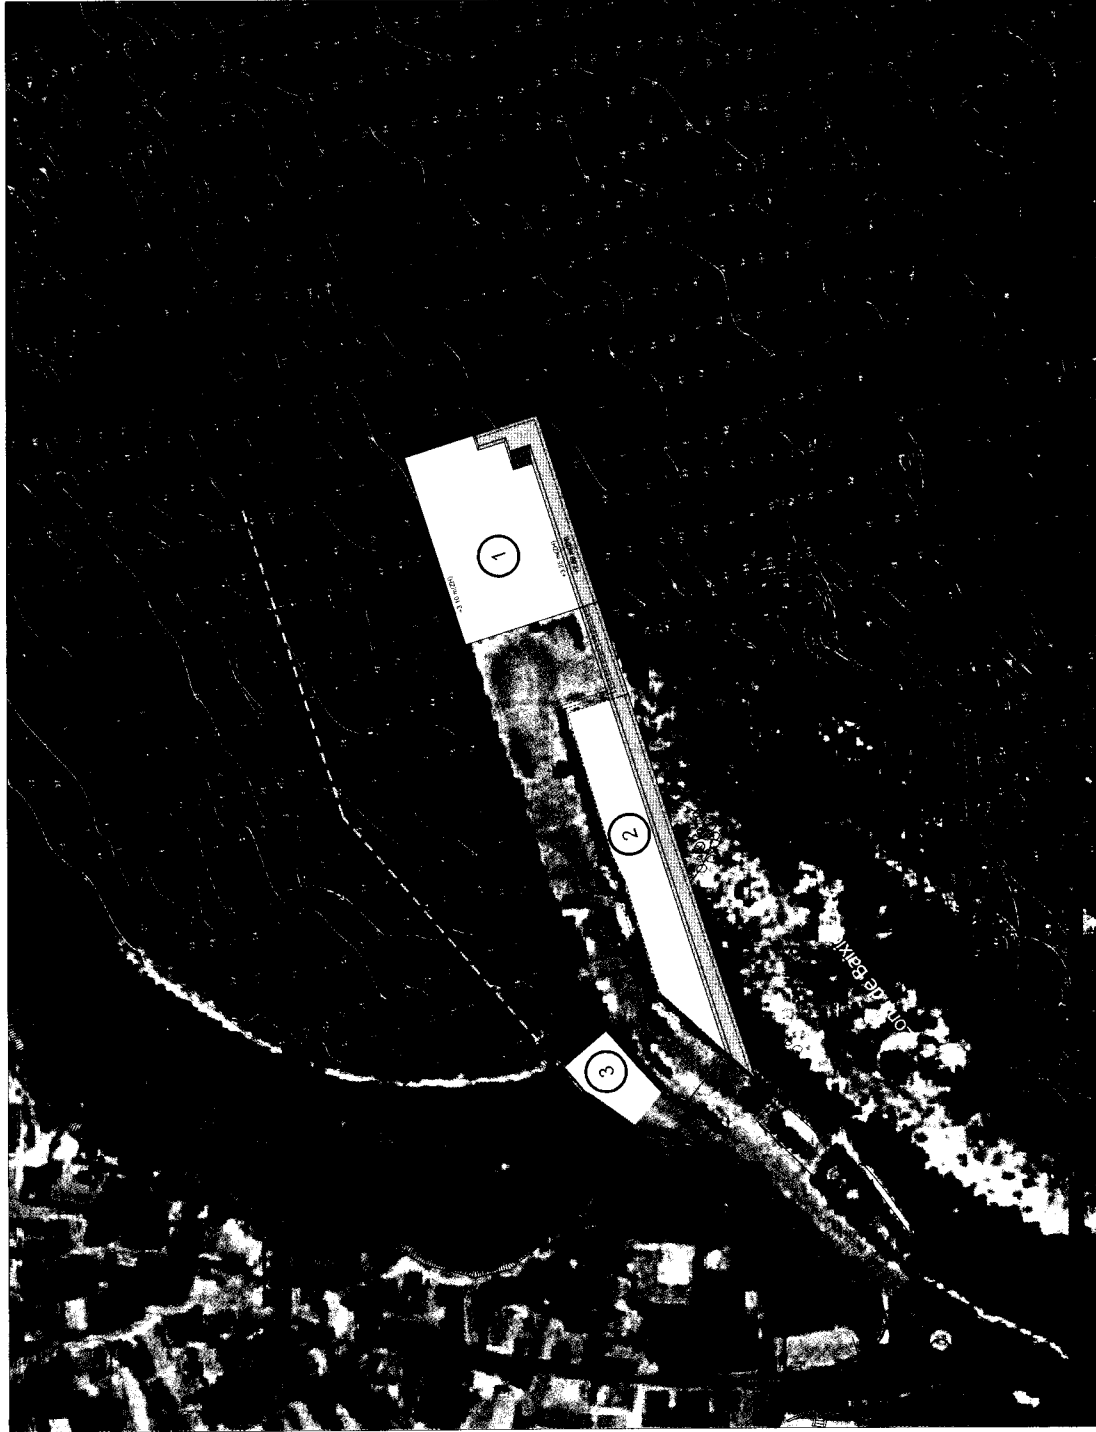

Perfil Tipo



① PROLONGAMENTO DO MOLHE CAIS
(40 m x 28 m)

② ALARGAMENTO DA PLATAFORMA
(12 m x 68 m)

③ REABILITAÇÃO DA RAMPA
