

Maura Soares

Assunto: 7º Relatório Periódico de Monitorização 1ºT-2023 PRR
Anexos: Relatório Periódico de Monitorização - 7º 2T2023 rev 20230731.pdf

De: Nuno ALM. Alves <Nuno.AL.Alves@azores.gov.pt>
Enviada: 31 de julho de 2023 16:26
Para: Rui Martins <rmartins@alra.pt>
Cc: Rui Silva <rsilva@alra.pt>; António MS. Almeida <Antonio.MS.Almeida@azores.gov.pt>; Bernardo A. Oliveira <Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt>
Assunto: 7º Relatório Periódico de Monitorização 1ºT-2023 PRR

Exmo. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Fundos Europeus na Região Autónoma dos Açores

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 6º do DRR n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, compete à DRPFE, enquanto órgão de coordenação técnica e monitorização, “elaborar e apresentar, aos órgãos de coordenação política — CGR — e de acompanhamento — CESA, relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso.” Assim, sendo, junto enviamos o 6º Relatório de Periódico de Monitorização do PRR, referente ao 1º trimestre de 2023, que foi igualmente enviado ao CESA.

Com os melhores cumprimentos

Nuno Melo Alves
Diretor Regional / Beneficiário Intermediário

"
DIREÇÃO REGIONAL DO PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS
📍 Caminho do Meio, 58 - São Carlos, 9701-853 Angra do Heroísmo
☎ (+351) 295 260 380 ✉ pr.azores@azores.gov.pt 🌐 [Portal PRR-Açores](#)
🌐 [Portal Recuperar Portugal](#)





PRR-AÇORES

2º **RELATÓRIO**
PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO
TRIMESTRE
2023

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
24 de julho de 2023

FICHA TÉCNICA

Título

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 2º Trimestre de 2023

Editor

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Endereço

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

drepa@azores.gov.pt | prp.acores@azores.gov.pt

<https://portal.azores.gov.pt/web/drepe/prp>

Data de Edição

24 de julho de 2023

ÍNDICE

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	4
RESUMO MARCOS & METAS.....	8
AValiação DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	9
Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)	9
Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional). 14	
Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional).....	16
Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	19
Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural).....	22
Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)	24
Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)	25
Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)	27
Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	28
Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	31
Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais)	34

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS

A Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE), enquanto órgão de coordenação técnica e de monitorização, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, tem como competência a elaboração e apresentação aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos relatórios acima referidos é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), relativos ao ponto de situação dos Marcos e Metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
 - Nota: os BF elaboram RP trimestrais até ao dia 10 do mês seguinte ao final de cada trimestre.
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte**, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; ao princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

Este 7º Relatório Periódico de Monitorização, à semelhança dos anteriores, tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR (SI PRR) pelos BF, no início do mês de julho de 2023, relativa ao segundo Relatório de Progresso Trimestral de 2023, referente aos onze investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores.

Em termos da terminologia utilizada para a caracterização do “Estado” dos Marcos e Metas, a Estrutura de Missão Recuperação Portugal (EMRP) alterou, no Sistema de Informação do PRR (SI PRR), a designação “Cumprido” e “Não Cumprido” para “Completo” e “Não Completo”, de forma a alinhar com a terminologia utilizada pela Comissão Europeia no seu sistema de informação, FENIX, no qual os Estados Membros reportam os pontos de situação dos M&M, com a designação “Completed” e “Not Completed”.

O período de incidência reporta-se ao 2.º Trimestre de 2023, com uma análise que incide também sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C considerados “Não Completos” nos trimestres anteriores, e uma análise sobre os Marcos e Metas dos Grupos A, B e C a cumprir nos quatro trimestres seguintes (até ao 2.º Trimestre de 2024).

Com base nas evidências dos indicadores dos Marcos e Metas a atingir, apresentadas pelos BF, que inclui o prazo contratualizado e os mecanismos de verificação constantes no [Acordo Operacional](#), o estado dos Marcos e Metas é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que concerne aos Marcos e Metas do trimestre em análise no Relatório de Progresso e dos trimestres anteriores, e classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os Marcos e Metas dos quatro trimestres seguintes.

Independentemente do estado dos Marcos e Metas, o Beneficiário Intermediário estabelece uma avaliação, sobre a informação/evidências/dificuldades apresentadas pelos BF, que reflete

se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condicionada (●) ou Crítica (●). Uma vez que está a decorrer o processo de Reprogramação do PRR, com reflexo em alguns Marcos e Metas do Grupo A, que, por esta via, teriam a sua avaliação Condicionada, optou-se por acrescentar neste procedimento de avaliação a tipologia “Reprogramação (●).

Os Marcos e Metas do Grupo A, denominadas de “desembolso”, são aqueles cujo seu cumprimento viabiliza os pedidos de pagamento por parte da Comissão Europeia ao Estado Membro, e como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, não só na sua dimensão quantitativa, mas também qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Os Marcos e Metas do Grupo B, funcionam como indicadores de monitorização do estado de execução dos investimentos, cujo cumprimento permite garantir o alcance dos Marcos e Metas do Grupo A, servindo de alerta na eventualidade de não serem cumpridos no calendário previamente definido.

Os Marcos e Metas do Grupo C, constam do anexo II do [Acordo Operacional](#), definidos pela Comissão Europeia, e funcionam como indicadores de monitorização associados a algumas metas do Grupo A, cuja monitorização será acompanhada adicionalmente nos prazos estabelecidos e, em alguns casos são coincidentes com Marcos e Metas do Grupo B.

A análise neste Relatório Periódico de Monitorização incidiu sobre o nível de execução de 91 Marcos e Metas, deste trimestre e dos quatro trimestres seguintes, incluindo os não completos em trimestres anteriores, com a distribuição temporal expressa na Tabela 1.

Tabela 1: Número de Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Metas	4T 21	1T 22	2T 22	3T 22	4T 22	1T 23	2T 23	3T 23	4T 23	1T 24	2T 24	Total
Grupo A	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	6
Grupo B	4	4	3	3	11	5	1	13	15	9	1	69
Grupo C	-	2	-	1	2	1	1	-	7	1	1	16
Total	4	6	3	4	14	6	3	13	25	10	3	91

Neste Relatório Periódico de Monitorização surge também uma análise relacionada com os Marcos e Metas anteriormente cumpridos, conforme consta na Tabela 2 e nas tabelas subsequentes relativas à análise individual dos investimentos.

Tabela 2: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023, com acumulado dos cumpridos

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
7	Grupo A	-	-	2	4	6	13
50	Grupo B	1	17	30	21	69	119
4	Grupo C	1	3	6	6	16	20
61*	Total	2*	20	38*	31	91	152

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (61+2+38=101)

Assim, constata-se que já foram cumpridos 62% dos 101 Marcos e Metas dos Grupos A, B e C que deveriam estar concluídos até ao 2.ºT de 2023, o que representa, globalmente, um bom nível de execução dos investimentos do PRR-Açores.

Analisando na perspetiva de cada um dos investimentos, verifica-se que 7 tem uma execução acima da média, destacando-se os investimentos C05-i05-RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural) e C20-i02-RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais) com uma execução de 100% dos Marcos e Metas, conforme consta da tabela seguinte:

Tabela 3: Marcos e Metas a cumprir até ao 2.ºT 2023

Investimento	Completo	Não Completo	Total	%
C01-i08-RAA	20	24	44	45%
C02-i04-RAA	2	2	4	50%
C03-i04-RAA	2	3	5	40%
C05-i04-RAA	4	1	5	80%
C05-i05-RAA	2	0	2	100%
C06-i05-RAA	0	3	3	0%
C07-i05-RAA	3	1	4	75%
C10-i04-RAA	4	1	5	80%
C14-i03-RAA	6	2	8	75%
C19-i06-RAA	15	1	16	94%
C20-i02-RAA	5	0	5	100%
Total	63	38	101	62%

A percentagem média global de cumprimento dos Marcos e Metas é nitidamente influenciada pelo valor absoluto da situação particular do investimento C01-i08-RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto). Verifica-se também que o investimento C06-i05-RAA (Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego) continua a não cumprir as metas contratualizadas.

No que concerne à análise pormenorizada do período em referência, no 2.ºT de 2023 estava previsto um marco de Grupo A, no investimento C07-i05-RAA (Circuitos Logísticos – Rede Viária Regional), o qual não foi cumprido, estando incluída a proposta de prorrogação do prazo de execução no processo de Reprogramação em curso. No 4.ºT 2023 estão previstos três Marcos e Metas do Grupo A, no estado “Atrasado” (dois do investimento C02-i04-RAA – Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores e um do investimento C14-i03-RAA – Transição Energética nos Açores), a que acresce uma meta do Grupo A para o 2.ºT 2024, também no estado “Atrasado” relativa ao investimento C05-i05-RAA (Relançamento Económico da Agricultura Açoriana). Estas situações foram devidamente assinaladas no processo de Reprogramação em curso dos investimentos do PRR e estão evidenciadas na análise seguinte (●) em cada um dos investimentos respetivos.

Sobre os Marcos e Metas do Grupo B, um foi considerado no estado completo e dezassete estão dentro do prazo, verificando-se trinta não completos e vinte e um atrasados. No que concerne aos Marcos e Metas do Grupo C, um está completo, três estão dentro do prazo, seis estão não completos e seis estão atrasados.

Foi completo um marco relativo ao 1.ºT 2022, continuando os restantes quatro Marcos e Metas do Grupos B que transitaram de 2021, e os vinte e seis de 2022, como não completos neste período.

Atendendo à situação reportada pelos diversos Beneficiários Finais, constata-se que persistem os mesmos constrangimentos que condicionam ou implicam algum atraso em certas medidas, essencialmente relacionados com fatores externos, como o aumento de preços, a falta de mão-de-obra, de matérias-primas ou de bens e serviços, que já se vinham a verificar na crise pandémica, mas agora agravados com os efeitos do conflito militar na Europa, o que vem enfatizar a necessidade de planeamento e de previsibilidade na gestão dos investimentos.



É no contexto dos constrangimentos acima identificados que resulta a avaliação expressa de seguida, enquanto, em paralelo, está a decorrer um processo de Reprogramação do PRR, ao nível dos Marcos e Metas do Grupo A. Os dois critérios definidos pela Comissão Europeia para alteração da programação contratualizada são relativos a fatores externos, relacionados com a guerra e a inflação, que resultam em aumento de custos ou necessidade de adiamento de prazos, ou à correção pontual de textos iniciais, que importa agora clarificar, sendo que as justificações apresentadas pelos BF devem ser devidamente fundamentadas e evidenciadas.

RESUMO MARCOS & METAS

Resumo 7º RP - 2ºT 2023

TOTAL
91

Marcos & Metas						
Investimento	2021	2022	2023	2024	Não completo/Atrasado	Completo/Dentro do prazo
C01-i08-RAA	2	17	17	6	40	2
C02-i04-RAA	0	2	2	0	4	
C03-i04-RAA	1	2	4	0	5	2
C05-i04-RAA	0	1	1	1	2	1
C05-i05-RAA	0	0	1	1	1	1
C06-i05-RAA	1	2	2	0	5	
C07-i05-RAA	0	0	1	1	1	1
C10-i04-RAA	0	1	2	0	2	1
C14-i03-RAA	0	2	5	0	6	1
C19-i06-RAA	0	0	9	4	3	10
C20-i02-RAA	0	0	3	0		3
Total Geral	4	27	47	13	69	22

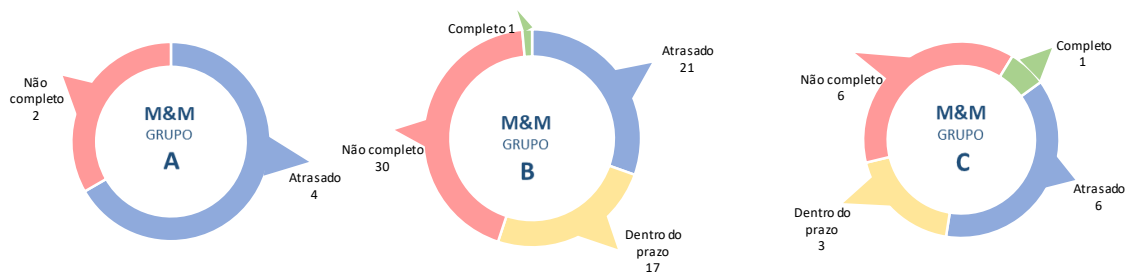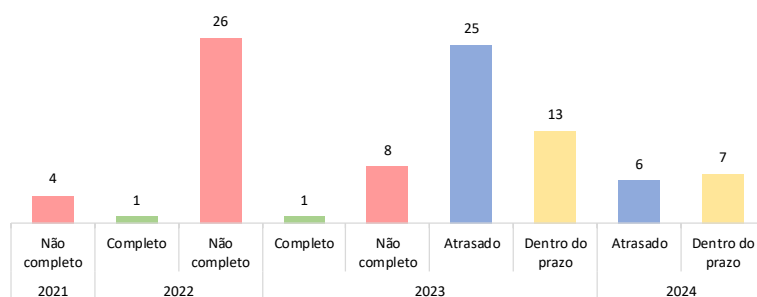

Completo	Dentro do prazo	Atrasado	Não completo	
1	1	16	24	C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
0	0	2	2	C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores
0	2	2	3	C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)
0	1	1	1	C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
0	1	1	0	C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana
0	0	2	3	C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA
0	1	0	1	C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores
1	0	1	1	C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"
0	1	4	2	C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores
0	10	2	1	C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA
0	3	0	0	C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)

AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)

Tabela 4: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
19	Grupo B	1	1	21	15	38	57
-	Grupo C	-	-	3	1	4	4
19*	Total	1*	1	24*	16	42	61

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (19+1+24=44)

Tabela 5: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
181	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas	N.º	2	4.ºT 2021	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
257	Assegurar a aquisição de 30% equipamentos informáticos	%	30	4.ºT 2021	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
1.36.1	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	C	Meta	NC	1.ºT 2025	●
187	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	B	Marco	NC	1.ºT 2024	●
210	Uniformização dos artigos referente à implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2022	B	Marco	C	2.ºT 2023	●
227	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem)	-	-	1.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2023	●
247	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da	-	-	1.ºT 2022	B	Marco	NC	1.ºT 2024	●

	interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação								
195	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	2.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
204	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de gestão de recursos humanos	-	-	2.ºT 2022	B	Marco	NC	1.ºT 2024	●
211	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	2.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
196	Levantamento dos requisitos para integração no Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	-	-	3.ºT 2022	B	Marco	NC	2.ºT 2024	●
212	Desenvolvimento e testes para implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	3.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
1.37.1	Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores	N.º	100	3.ºT 2022	C	Marco	NC	1.ºT 2024	●
240	Lançamento do procedimento concursal para Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	3.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
197	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
220	Entrada em produção do sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	1.ºT 2024	●
248	Desenvolvimento e testes no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	4.ºT 2022	B	Marco	NC	3.ºT 2024	●
255	Assegurar a aquisição de 75% equipamentos hospitalares	%	75	4.ºT 2022	B	Marco	NC	4.ºT 2023	●
258	Assegurar a aquisição de 60% equipamentos informáticos	%	60	4.ºT 2022	B	Marco	NC	2.ºT 2024	●
1.36.3	Lançamento de procedimento de contratação pública para	-	-	1.ºT 2023	C	Marco	NC	4.ºT 2024	●

	desenvolvimento do Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação								
205	Entrada em produção de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
216	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS	N.º	1	1.ºT 2023	B	Meta	NC	2.ºT 2024	●
241	Desenvolvimento e testes para Implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	1.ºT 2023	B	Marco	NC	2.ºT 2024	●
249	Entrada em produção de um sistema no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	1	1.ºT 2023	B	Marco	NC	4.ºT 2024	●
250	Entrada em produção de dois sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	2	2.ºT 2023	B	Marco	NC	1.ºT 2025	●
183	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal dos utentes	N.º	1	3.ºT 2023	B	Marco	A	3.ºT 2024	●
188	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal do Profissional de Saúde	N.º	1	3.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2025	●
206	Formação e Projeto-piloto do sistema de Informação Integrado de Gestão de RH dos Hospitais EPER			3.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2025	●
224	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde	N.º	500	3.ºT 2023	B	Meta	A	1.ºT 2024	●
228	Desenvolvimento e testes no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica / laboratório/áreas produtoras de imagem)			3.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2024	●
251	Entrada em produção de três sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	3	3.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2025	●
199	Entrada em produção do Portal	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2026	●
207	Entrada em produção.	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	1.ºT 2026	●

229	Entrada em produção da integração de anatomia patológica	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	4.ºT 2024	●
242	Entrada em produção por módulos	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	4.ºT 2024	●
256	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades	%	100	4.ºT 2023	B	Meta	A	4.ºT 2024	●
201	Implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	A	4.ºT 2025	●
213	Entrada em produção do sistema	-	-	1.ºT 2024	B	Marco	A	1.ºT 2025	●
230	Entrada em produção da integração de laboratórios	-	-	1.ºT 2024	B	Marco	A	4.ºT 2024	●
244	Garantir a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	5	1.ºT 2024	B	Meta	A	3.ºT 2025	●
253	Assegurar a aquisição de equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento das necessidades	%	100	1.ºT 2024	B	Meta	DP		●
1.36.2	Entrada em produção da solução tecnológica que suporta o portal de acesso digital ao processo clínico	N.º	1	1.ºT 2024	C	Marco	A	1.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 45% dos 44 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo todos do Grupo B, não estando completos 21 do Grupo B e 3 do Grupo C. Até ao final do 1º trimestre de 2024, 1 meta encontra-se “Dentro do Prazo” e 16 no estado “Atrasado”.

Informação complementar:

- O Beneficiário Final, Secretaria Regional da Saúde e Desporto, apresentou uma proposta de redesenho e reorganização do investimento Hospital Digital da RAA, incluindo uma alteração financeira, física e temporal, bem como a simplificação dos Marcos e Metas, a qual está neste momento em análise por parte do BI;
- À data de reporte nota-se alguma evolução ao nível global do investimento, nomeadamente:
 - **Portal do Utente:** Encontra-se em fase de validação uma lista detalhada de requisitos técnicos, funcionais e não funcionais da solução a implementar, para suportar a escolha e seleção de potenciais fornecedores;
 - Foram abertos os procedimentos para a aquisição de serviços de implementação e licenciamento do Sistema de Consolidação Financeira do SRS,

para implementação do *upgrade* do sistema de gestão integrado “Primavera” e para a consultoria de suporte à construção do futuro modelo de serviços partilhados para as Unidades de Saúde de Ilha do SRS. Em fase de análise de requisitos encontram-se os projetos do Doente Deslocado, da Gestão de Equipamentos, da Referenciação e da Anatomia Patológica. Estão em preparação as peças do procedimento Modernização e Integração dos Cuidados de Saúde Primários;

- **Telemedicina:** o indicador do nº de teleconsultas já se encontra definido e os procedimentos referentes aos equipamentos (videoconferência e *webcams*) de telemedicina foram novamente publicados, após a não adjudicação em concursos anteriores.

Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 6: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	2	2	4
-	Grupo B	-	-	2	0	2	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2*	Total	-	-	2*	2	4	6

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (2+2=4)

Tabela 7: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
358	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - construção de edifícios	N.º	36	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2025	●
359	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	N.º	132	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
360	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – construção de edifícios	N.º	70	4.ºT 2023	A	Meta	A	4.ºT 2025	●
361	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	N.º	318	4.ºT 2023	A	Meta	A	4.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 50% dos 4 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 2 do Grupo A, não estando completas 2 Metas do Grupo B. Até ao final de 2023, 2 Metas do Grupo A encontram-se no estado “Atrasado”, cuja revisão do prazo está contemplada no processo de Reprogramação em curso do PRR.

Os constrangimentos externos, nomeadamente no que concerne à disponibilidade de mão-de-obra e matérias-primas, principalmente as relacionadas com a eficiência energética, continuam a condicionar gravemente a execução deste investimento, quer ao nível de preços, quer ao nível de prazos, dificultando o cumprimento dos Marcos e Metas.

No âmbito do processo de Reprogramação em curso, dirigido às correções necessárias decorrentes desta situação em particular, o Beneficiário Final apresentou uma proposta atualizada das Metas, que se encontra em análise pela Comissão Europeia. Assim, a avaliação do cumprimento dos Marcos e Metas acima identificados fica condicionada a este procedimento.

Informação complementar:

Relativamente à construção de edifícios, estão a decorrer 22 procedimentos, dos quais 4 relativos a projetos de infraestruturas, 2 a concursos para execução de infraestruturas, 1 de execução de empreitada de construção, 6 em fase de licenciamentos e 9 a revisão de projetos e consulta de contratação. Não se prevê, este ano, a conclusão de qualquer construção, estando a decorrer procedimentos com vista ao início das empreitadas, maioritariamente no 2º semestre de 2023, com conclusão prevista para o 2.º semestre de 2024 e 2025.

Quanto à renovação de edifícios, estão em curso 15 procedimentos, 1 corresponde a execução de empreitada, 8 na fase de procedimento de contratação e os restantes 6 em fase de projeto/revisão ou de licenciamento. Já foram lançados concursos para reabilitação de 9 fogos na ilha do Pico, 53 na ilha Terceira, 5 imóveis na Graciosa, 8 imóveis na ilha das Flores e 14 na ilha do Faial. Já foi contratada a empreitada de reabilitação de uma moradia no concelho de Vila Franca do Campo, uma no concelho da Ribeira Grande e uma na Povoação, bem como a da renovação das 9 no concelho da Povoação.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 8: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
2	Grupo B	-	1	3	2	6	8
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
2*	Total	-	2	3*	2	7	9

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (2+3=5)

Tabela 9: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
443	Viaturas adquiridas	N.º	26	4.ºT 2021	B	Meta	NC	4.ºT 2023	●
441	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	20	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
444	Viaturas adquiridas	N.º	46	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
442	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	80	4.ºT 2023	B	Meta	A	4.ºT 2024	●
438	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	312	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
445	Viaturas adquiridas	N.º	66	4.ºT 2023	B	Meta	A	4.ºT 2024	●
3.16.1	Relatório sobre os progressos alcançados na consecução da meta 3.16, apresentando informações sobre: i) o número de crianças abrangidas pela isenção de pagamento de mensalidades de infantários; ii) o número de crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo; iii) o número de estudantes do ensino superior apoiados; o número de novas vagas para crianças em creches e	-	-	4.ºT 2023	C	Meta	DP	-	●

na rede de amas.

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica;
●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 40% dos 5 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 2 do Grupo B, não estando completas 3 Metas também do Grupo B. Até ao final de 2023, 2 Metas encontram-se “Dentro do Prazo” e 2 no estado “Atrasado”.

Informação complementar:

443, 444 e 445:

- O número de viaturas aprovadas nas candidaturas apresentadas no âmbito do Programa “Gerações em Movimento” já ultrapassa a meta estabelecida para o final de 2023:
 - Em Edições anteriores aos avisos foram aprovadas 10 viaturas;
 - Na 1ª Fase ([Aviso n.º2/C03-i04/2022](#), publicado a 06/01/2022, com uma dotação global de 1,5 M€), foram aprovadas 41 viaturas;
 - Na 2ª Fase ([Aviso n.º 4/C03-i04/2022](#), publicado a 30/06/2022, com uma dotação global de 1,2 M€), foram aprovadas 30 viaturas.
- A 26-06-2023 foi lançado o [Aviso nº 15/AAC/C03-i04/2023](#) que permitirá, em conjunto com as edições anteriores, alcançar a Meta de 100 viaturas.
- Continuam a verificar-se constrangimentos externos, nomeadamente no que respeita ao prazo de entrega destas viaturas por parte dos fornecedores, por vezes superior a 1 ano, dada a escassez no mercado de alguns componentes necessários à produção, aliada à elevada e crescente procura de viaturas elétricas por toda a Europa, tendo, até ao momento, sido entregues 19 viaturas. No entanto, são fortes as evidências que, no final da execução do PRR, o objetivo será cumprido, pelo que a avaliação é favorável.

● Reprogramação

441:

- Antecipam-se constrangimentos no que respeita à construção/remodelação de novos equipamentos dada a conhecida escassez de mão-de-obra, materiais de construção e consequente subida de preços e aumento dos custos, agravado pela condição arquipelágica da Região, podendo também verificar-se algum atraso nos processos de contratação pública. Face à programação temporal das obras em questão, apenas existem condições para disponibilização de novas vagas no decorrer do 2º semestre de 2024, havendo, ainda assim, grande risco deste prazo derrapar, dependendo, sobretudo, do tempo necessário para efetivar o processo de contratação pública;
- O ponto de situação atual é o seguinte:
 - Construção de Lar Residencial e CAO da Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa encontra-se em fase de lançamento de concurso público para a empreitada da obra com data-limite para entrega de propostas a 24/07/2023;

- A obra do CACI da Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico encontra-se em fase de licenciamento do projeto de Arquitetura;
- Ampliação e Remodelação do Lar Residencial Kavivo da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia encontra-se em fase de preparação dos projetos de especialidades, tendo projeto de arquitetura sido aprovado pelo respetivo município no dia 18/05/2023;
- A obra de adaptação de imóvel a Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto encontra-se em fase de conclusão do projeto de arquitetura para posterior entrega ao município para apreciação;
- A obra de CACI e Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia da Horta encontra-se em fase de adjudicação dos serviços de elaboração do projeto de arquitetura, prevendo-se a outorga do contrato de adjudicação até final do corrente mês de julho;
- A construção do CATL inclusivo e centro de dia especializado na ilha das Flores encontra-se em fase de licenciamento camarário do projeto de execução, prevendo-se lançar o concurso de empreitada durante o mês de setembro.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 10: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
1	Grupo C	-	1	1	1	3	4
4*	Total	-	1	1*	1	3	7

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (4+1=5)

Tabela 11: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.17.2	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos dois programas de investimento no total. Os programas de invest. devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar os critérios de seleção / elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados	-	-	1.ºT 2022	C	Marco	NC	3.ºT 2023	●
5.17.4	Apresentação de um relatório anual que comprove a entrega de um total de 50 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento, incluindo informações sobre: investimentos	-	-	4.ºT 2023	C	Meta	A	2.ºT 2024	●

O relatório será elaborado após a disponibilização dos instrumentos aprovados às empresas regionais. Na medida em que o instrumento de empréstimos participativos será publicado em julho, com uma verba prevista de 20 milhões de euros, e que o segundo instrumento será lançado subsequentemente, só será possível a execução da verba cumulativa de 50 milhões de euros para ambos os instrumentos no primeiro semestre do próximo ano.

Informação complementar:

Será publicado durante o mês de julho o segundo instrumento do Fundo de Capital das Empresas dos Açores (FCEA) – Programa Capital Participativo Açores I, num montante de 20 milhões de euros, sob a forma de empréstimos participativos, tendo como objetivos:

- Contribuir para reduzir a subcapitalização das empresas da Região Autónoma dos Açores e responder à dificuldade na angariação de financiamento junto dos Intermediários Financeiros, problemas agravados pela recente crise pandémica e/ou pela atual conjuntura macroeconómica, potenciando-se o investimento privado e o dinamismo empresarial;
- Colmatar a falha de mercado no que diz respeito ao acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte de empresas com sede e atividade na Região Autónoma dos Açores.

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)

Tabela 12: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	1	1	2
1	Grupo B	-	1	-	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2*	Total	-	1	-	1	2	4

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (2)

Tabela 13: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
599	Ilhas com sistema de avisos agrícolas	N.º	2	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
5.19	Estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e da segurança dos alimentos	N.º	3	2.ºT 2024	A	Meta	A	4.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica;
●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 1 do Grupo A e 1 do Grupo B. Até ao final do 2º trimestre de 2024, 1 Meta encontra-se “Dentro do Prazo” e 1 Meta do Grupo A no estado “Atrasado”, cuja revisão do prazo está contemplada no processo de Reprogramação em curso do PRR.

● Reprogramação:

5.19:

- Das três estruturas previstas, no que respeita à Construção do novo edifício do Serviço de Classificação de Leite de São Miguel, tudo decorre dentro dos prazos contratualizados, no entanto, duas estruturas apresentam atrasos que podem colocar em risco o cumprimento do prazo contratualizado, nomeadamente:
 - Construção do Matadouro de São Jorge – Foi publicado a 22 de junho concurso público internacional para a Empreitada de Construção do Matadouro de São Jorge, no entanto, não foram recebidas propostas para o Lote 1 - Construção civil, redes de fluídos, instalações elétricas e estação de tratamento de águas residuais, nem para o Lote 4 - Central de água quente. Desta forma, foi

necessário proceder à reformulação do projeto, revisto no 2.º Trimestre de 2023. Prevê-se o lançamento de novo concurso público no 3.º Trimestre de 2023 e o início da obra no 2.º Trimestre de 2024. Tendo em conta que o prazo previsto para a execução da obra é de 18 meses, o prazo inicialmente contratualizado encontra-se comprometido.

- Remodelação e Ampliação do Matadouro do Pico - O projeto encontra-se em revisão e prevê-se o lançamento de novo concurso público no 4.º Trimestre de 2023 e o início da obra no 2.º Trimestre de 2024, com um prazo de execução previsto de 18 meses, algo que compromete o prazo inicialmente contratualizado para esta Meta.

Informação complementar:

599:

- Foram apresentadas 6 candidaturas ao concurso público com publicidade internacional para o desenvolvimento de uma rede de monitorização e avisos agrícolas ao nível de ilha, prevendo-se a adjudicação, celebração do contrato e início da execução no 3.º trimestre de 2023.
- De acordo com a calendarização dos trabalhos, a emissão de avisos agrícolas nas ilhas de São Miguel e Terceira iniciar-se-á no 3.º trimestre de 2023, dando cumprimento à meta estabelecida.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)

Tabela 14: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	3	-	3	3
-	Grupo C	-	-	-	2	2	2
-	Total	-	-	3*	2	5	5

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (3)

Tabela 15: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
651	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	260	4.ºT 2021	B	Meta	NC	4.ºT 2023	●
652	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	520	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
656	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	3	4.ºT 2022	B	Meta	NC	4.ºT 2024	●
6.10.1	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	780	4.ºT 2023	C	Meta	A	4.ºT 2024	●
6.11.1	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	7	4.ºT 2023	C	Meta	A	4.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; **NC:** Não Completo; **DP:** Dentro do Prazo; **A:** Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Ainda não foram cumpridos nenhum dos Marcos e Metas previstos até ao 2º trimestre de 2023, sendo todos do Grupo B. Até ao final de 2023, 2 Metas encontram-se no estado “Atrasado”.

Este investimento continua a revelar um atraso considerável, que poderá pôr em causa o alcance das Metas A contratualizadas.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 16: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	1	-	1	2
2	Grupo B	-	1	-	-	1	3
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
3*	Total	-	1	1*	-	2	5

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (3+1=4)

Tabela 17: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
7.14	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	-	-	2.ºT 2023	A	Marco	NC	4.ºT 2023	●
715	Contratos de empreitada todos assinados: 10 contratos assinados	-	-	2.ºT 2024	B	Marco	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica;
 ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 75% dos 4 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 1 do Grupo A e 2 do Grupo B, não estando completo 1 Marco do Grupo A, cuja revisão do prazo está contemplada no processo de Reprogramação em curso. Até ao final do 2º trimestre de 2024, 1 Marco encontra-se “Dentro do Prazo”.

● Reprogramação:

714:

- Estão assinados 3 contratos: Variante ao Portal do Vento, Variante às Furnas e Variante a S. Roque. Até ao 4ºT de 2023 serão assinados 5 contratos, referentes aos seguintes projetos:
 - Variante a Madalena: A obra foi adjudicada, prevendo-se que no início de agosto de 2023 seja efetuada a posse administrativa dos terrenos, procedendo-se, de imediato, à assinatura o contrato da empreitada.
 - Variante à Horta 2ª fase: Foi efetuada a adjudicação da obra, estando a decorrer o processo expropriativo, tendo já sido publicada a respetiva Declaração de Utilidade Pública.
 - Ligação entre a E.R. nº 3-2ª e a E.R. nº 4-2ª: A obra foi adjudicada prevendo-se que no início de agosto de 2023 seja efetuada a posse administrativa dos terrenos, procedendo-se, de imediato, à assinatura o contrato da empreitada.

- Variante a Vila do Porto: A obra foi adjudicada, estando a decorrer o processo expropriativo.
- Transversal de S. Jorge: Obra em fase de adjudicação, estando a decorrer o processo expropriativo.

Informação complementar:

715:

- Para atingir a meta dos 10 contratos, para além dos 8 mencionados anteriormente, prevê-se assinar até ao 2.ºT de 2024, os contratos das Variante às Capelas e Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra, cujos pontos de situação são os seguintes:
 - Variante a Capelas - em Procedimento AIA (Avaliação do Impacto Ambiental);
 - Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra - em fase final de revisão do projeto.

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"

(Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 18: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	-	1	1
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
2	Grupo C	1	-	-	1	2	4
3*	Total	1*	-	1*	1	3	6

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (3+1+1=5)

Tabela 19: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
10.8	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC	-	-	4.ºT 2022	A	Marco	NC	1.ºT 2024	●
10.9.2	Início da Construção e armamento do navio de investigação	-	-	2.ºT 2023	C	Marco	C	-	●
10.10.1	Pelo menos 50% da execução da Empreitada	-	-	4.ºT 2023	C	Marco	A	1.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 80% dos 5 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 1 do Grupo B e 3 do Grupo C, não estando completo 1 Marco do Grupo A, cuja revisão do prazo está contemplada no processo de Reprogramação em curso. Até ao final de 2023, 1 Marco encontra-se no estado "Atrasado".

● Reprogramação

10.8 e 10.10.1:

- Está a decorrer o Concurso Público para a celebração de um contrato misto de "Empreitada do Tecnopolo – MARTEC – PRR" com um preço base de 20.900.000,00€.
- O atraso verificado na execução do Marco, impossibilita a concretização atempada do Marco 941.

Informação complementar:

A 27 de junho realizou-se a cerimónia de assinatura do auto de início de construção do navio de investigação, cumprindo-se assim mais um Marco contratualizado.

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 20: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	1	1	1
6	Grupo B	-	1	-	2	3	9
-	Grupo C	-	-	2	1	3	3
6*	Total	-	1	2*	4	7	13

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (6+2=8)

Tabela 21: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
14.11.2	Conclusão dos ensaios nos poços	-	-	4.ºT 2022	C	Marco	NC	4.ºT 2023	●
14.13.1	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA: início das obras nas ilhas do Faial, das Flores e do Corvo	-	-	4.ºT 2022	C	Marco	NC	1.ºT 2024	●
14.12	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	kW	850	4.ºT 2023	A	Meta	A	2.ºT 2024	●
1059	Conclusão das obras do PF e PE	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	2.ºT 2024	●
1063	Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico	-	-	4.ºT 2023	B	Marco	A	2.ºT 2024	●
1067	Aumento da capacidade instalada em, pelo menos, 3,3 MW	MW	3.3	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
14.11.3	Contratação da instalação de novos grupos CGPV e CGPA	-	-	4.ºT 2023	C	Marco	A	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 75% dos 8 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo todos do Grupo B, não estando completos 2 Marcos do Grupo C. Até ao final de 2023, 1 Marco e Meta encontra-se “Dentro do Prazo” e 4 no estado “Atrasado”, incluindo uma Meta do Grupo A, cuja revisão do prazo está contemplada no processo de Reprogramação em curso do PRR.

● Condicionada

14.11.2:

- Os ensaios de produção dos Poços PA5, PA6 e PA7 encontram-se em curso desde julho de 2022. Contudo, estes poços tendem a apresentar um comportamento distinto dos anteriores, pelo que os trabalhos inerentes aos ensaios de produção destes Poços estão a ser mais exigentes, atrasando o início da produção. Foi efetuada uma prestação de serviços de aluguer de uma bomba submersível de alta temperatura que apoiará na determinação das características produtivas dos poços do Campo Geotérmico do Pico Alto. Encontra-se em curso a preparação dos equipamentos assim como diversas atividades preparatórias aos ensaios.
- No período de reporte foram dados por concluídos os ensaios do poço CL8 que estavam também em falta.

14.11.3:

- A conclusão das especificações técnicas do Cadernos de Encargos que suportará a contratação do novo grupo da Central Geotérmica Pico Alto (CGPA), necessita da caracterização da energia primária disponível nos poços geotérmicos que serão avaliados até ao final de 2023 (Marco 14.11.2);
- Deste modo, prevê-se a contratualização da aquisição dos equipamentos da Central Geotérmica Pico Vermelho no 4º trimestre de 2023 e da CGPA no 3º trimestre de 2024.

● Crítica

14.13.1:

- A 07/11/2022 terminou o prazo para a entrega de propostas relativo ao concurso público internacional para o "Contrato de conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios, entrada em serviço e garantia dos Sistemas de Armazenamento de Energia e Sistema de Gestão para as Ilhas Faial, Flores e Corvo". Foi decidida a não adjudicação das propostas apresentadas ao procedimento e, em 16/12/2022, foi autorizada abertura de novo procedimento concursal, publicitado a 11/01/2023. O prazo de entrega das propostas terminou a 31/05/2023, ficando o concurso "deserto" sem qualquer proposta. Ainda em 2023 será aberto novo concurso, pelo que a consignação destas empreitadas só deverá ocorrer após o 4.º trimestre de 2023 prevendo-se o início das obras no 1.º T 2024.

1063:

- O estudo de dimensionamento e viabilidade técnica dos Sistemas de Armazenamento de Energia para a Ilha do Pico, encontra-se em fase de conclusão, com entrega prevista no mês de julho 2023. Assim, estima-se que o lançamento do concurso público internacional para a instalação dos Sistemas de Armazenamento de Energia para as ilhas de São Jorge e Pico ocorra durante o 4.º trimestre de 2023.

● Reprogramação:

14.12 e 1059:

- A execução da meta está atrasada considerando o atraso no cumprimento dos Marcos a ela associados. A prorrogação do prazo de conclusão do Parque Eólico deve-se a

atrasos inerentes ao processo de contratação pública de adjudicação da empreitada de fornecimento dos equipamentos do parque e respetiva instalação - a consignação dos trabalhos ocorreu apenas em 7 de novembro de 2022, com prazo de execução de 18 meses, pelo que a conclusão das obras do Parque Eólico, apenas ocorrerá no segundo trimestre de 2024. Esta Meta do grupo A está a ser objeto de reprogramação, nomeadamente em termos de prazo de contratualização.

Informação complementar:

1067:

- Mantém-se dentro do prazo estando previsto o seu cumprimento na data contratualizada, até ao período de análise foram atingidos 0.66373 MW.

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 22: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
15	Grupo B	-	9	1	2	12	27
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
15*	Total		10	1*	2	13	28

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (15+1=16)

Tabela 23: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1433	Aprovação do caderno de especificação de requisitos para o desenvolvimento do Novo Portal de Serviços da APR (frontoffice e backoffice)	N.º	1	1.ºT 2023	B	Meta	NC	3.ºT 2023	●
1422	Lançamento de projeto-piloto com posto móvel de atendimento ao cidadão	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	A	3.ºT 2024	●
1428	Aprovação do caderno de especificação de requisitos funcionais e técnicos para implementar o roll-out da plataforma de interoperabilidade eHUB-RAA baseada em FLOSS	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
1434	Entrega do produto mínimo viável para o Simulador de serviços transacionais e online com 3 serviços disponíveis	N.º	3	3.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
1439	Lançamento de procedimento de contratação pública para o fornecimento da plataforma tecnológica	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
1447	Fornecimento e instalação de plataforma SIEM (Information and Event Management) e solução de análise de tráfego para suportar o Centro de Operações	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●

	de Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360								
1453	Entrada em produção do Sistema Integrado de Gestão da Formação da Administração Pública Regional	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	A	1.ºT 2024	●
1458	Formação de, até 100, trabalhadores da Administração Pública Regional em metodologias de desenho de serviços públicos	N.º	1	3.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
19.18.1	Relatório sobre a execução dos projetos: - APR+ Acessível, Inclusiva e Aberta - APR+ Serviços mais ágeis - APR+ Proativa - Portal móvel para a administração pública regional - APR+ Apta para o futuro	-	-	4.ºT 2023	C	Marco	DP	-	●
1423	Aprovação do Programa de literacia digital e em Administração aberta/Open Government	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1440	Aprovação do Programa de literacia digital e em Administração aberta/Open Government	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1448	Fornecimento e instalação de plataforma SOAR (Automation, Orchestration and Threat Intelligence Management) para suportar o Centro de Operações de Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●
1459	(Re)desenho de 1 serviço público, de carácter inovador, assente em metodologias de desenho de serviços públicos e em tecnologias digitais e/ou desenvolvidos em cocriação com partes interessadas (academia, cidadãos e empresas, e.g.), em contexto de	N.º	1	1.ºT 2024	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica;
●: Reprogramação

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 94% dos 16 Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo todos do Grupo B. Até ao final do 1º Trimestre de 2024, 10 Marcos e Metas encontram-se “Dentro do Prazo” e 2 no estado “Atrasado”.

● Condicionada

1433:

- Estão a ser reunidos elementos e especificidades técnicas para avaliar soluções de mercado nesta área que cumpram os requisitos de integração com todo o ecossistema. No entanto, atenta a complexidade da solução e as suas especificações técnicas, conjugadas com o impacto da conjuntura atual, existe o risco de atraso no cumprimento desta meta.

1453:

- O atraso verificado entre a decisão de adjudicação e a celebração do contrato condicionou o cumprimento da Meta no prazo contratualizado, motivo pelo qual foi definido novo prazo de implementação. Não obstante, prevê-se que no decurso do 3º trimestre de 2023 seja possível o "go live" do SIGEF com algumas funcionalidades.

Informação complementar:

1422:

- No âmbito deste projeto serão adquiridos 11 postos de atendimento móveis (viaturas elétricas) da RIAC, sendo que até ao 3.ºT 2023 existirão 2 postos móveis de atendimento ao cidadão para prova de conceito. O projeto ficará concluído até final do 3.ºT 2024, com a disponibilização de uma APP para os cidadãos com os serviços da RIAC.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais)

Tabela 24: Resumo dos Marcos e Metas - RP 2.º T 2023

Completo até 1T 2023	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 2ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
3	Grupo B	-	3	-	-	3	6
1	Grupo C	-	-	-	-	-	1
5*	Total	-	3	-	-	3	8

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 2.ºT de 2023 (5)

Tabela 25: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Tipo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1542	Aquisição de equipamentos digitais móveis	N.º	18.000	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
1546	Ambientes educativos inovadores	N.º	220	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●
1550	Conceção de MOOCs	N.º	8	4.ºT 2023	B	Meta	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica; ●: Reprogramação

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Foram cumpridos 100% dos Marcos e Metas até ao 2º trimestre de 2023, sendo 1 do Grupo A, 3 do Grupo B e 1 do Grupo C. Até ao final de 2023, todos os Marcos e Metas encontram-se “Dentro do Prazo”.

Informação complementar:

1542:

- Está a decorrer um concurso público internacional para aquisição de 1.464 equipamentos;
- Estão a decorrer os procedimentos contratuais para aquisição dos equipamentos para os manuais escolares digitais para o ano escolar de 2023/24;
- Foram adquiridos 14.916 equipamentos, nomeadamente:
 - 4.000 computadores e 1.000 tablets em 2021
 - 3.028 computadores e 1.000 tablets em 2022
 - 2.875 tablets e 3.013 Chromebooks Go aem 2022, no âmbito da aquisição dos manuais digitais

1546:

- Estão a decorrer os procedimentos contratuais para aquisição de manuais escolares digitais, bens e serviços conexos para o ano escolar de 2023/24.

- Foi lançado concurso público para aquisição de equipamentos especializados para sala de aula, como jogos didáticos, pianos digitais, mesas de mistura, microfones, câmaras digitais, mesas digitalizadoras, kits de sensores digitais e microscópios digitais.

1550:

- Foram desenvolvidos e disponibilizados 7 cursos: 4 para professores e 3 para encarregados de educação:
 - Para professores: "Ferramentas Digitais"; "Segurança Online"; "Gamificação como ferramenta para educar" e "Inovação e Design Thinking";
 - Para encarregados de educação: "Competências e literacia informática básica"; "Ferramentas Digitais (e-mail, videochamada e armazenamento de informação)"; e "Redes Sociais: perigos e cuidados a ter na sua utilização".
- Estão em desenvolvimento 5 cursos. No fim do corrente ano estarão disponíveis 12 cursos: 6 para professores e 6 para encarregados de educação, ultrapassando-se a meta prevista inicialmente.



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU
