

Edite Azevedo

Assunto: FW: PRR - Relatório de Periódico Monitorização – 4.ºT 2022
Anexos: Relatório Periódico de Monitorização - 4ºT2022 final.pdf

De: Rui Martins <rmartins@alra.pt>
Enviada: 1 de fevereiro de 2023 20:12
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt>
Assunto: Fwd: PRR - Relatório de Periódico Monitorização – 4.ºT 2022

Rui Martins

**DEPUTADO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**

VICE-PRESIDENTE DO GRUPO
PARLAMENTAR DO CDS

Telefone: [+351 96 851 54 47](tel:+351968515447) |

Email: rmartins@alra.pt

Morada: Assembleia Legislativa da R.A.A |
Rua Marcelino Lima, 9901-858 Horta

Site: www.alra.pt

Outlook mobile

From: Nuno ALM. Alves <Nuno.AL.Alves@azores.gov.pt>
Sent: Wednesday, February 1, 2023 8:10:21 PM
To: Rui Martins <rmartins@alra.pt>
Cc: António MS. Almeida <Antonio.MS.Almeida@azores.gov.pt>; Bernardo A. Oliveira <Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt>
Subject: FW: PRR - Relatório de Periódico Monitorização – 4.ºT 2022

Exmo. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Fundos Europeus na Região Autónoma dos Açores

Novo envio, agora com o anexo que faltou no email anterior.

Com os melhores cumprimentos

Nuno Melo Alves

*Diretor Regional/Regional Director
Gestor do PO AÇORES 2020/Managing Authority OP AÇORES 2020*



*Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Regional Directorate for Planning and Structural Funds
drepa@azores.gov.pt
POACORES2020@AZORES.GOV.PT*

De: Nuno ALM. Alves

Enviada: 1 de fevereiro de 2023 19:41

Para: rmartins@alra.pt

Cc: António MS. Almeida <Antonio.MS.Almeida@azores.gov.pt>; Bernardo A. Oliveira <Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt>

Assunto: PRR - Relatório de Periódico Monitorização – 4.ºT 2022

Exmo. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento e Fiscalização da Execução de Fundos Europeus na Região Autónoma dos Açores

Junto enviamos o Relatório de Periódico de Monitorização do PRR, referente ao terceiro trimestre de 2022, que foi igualmente enviado ao CESA.

Com os melhores cumprimentos

Nuno Melo Alves

Diretor Regional/Regional Director

Gestor do PO AÇORES 2020/Managing Authority OP AÇORES 2020



Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Regional Directorate for Planning and Structural Funds

drepa@azores.gov.pt

POACORES2020@AZORES.GOV.PT

POACORES2020.AZORES.GOV.PT/

PRR-AÇORES

4^o TRIMESTRE
**RELATÓRIO
PERIÓDICO DE
MONITORIZAÇÃO**
2022

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
31 de janeiro de 2023



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

FICHA TÉCNICA

Título

Relatório Periódico de Monitorização do PRR-Açores – 4º Trimestre de 2022

Editor

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Endereço

Caminho do Meio, 58 – São Carlos

9701-853 Angra do Heroísmo

Tel.: +351 295 206 380

drepa@azores.gov.pt | prp.acores@azores.gov.pt

<https://portal.azores.gov.pt/web/drepe/prp>

Data de Edição

31 de janeiro de 2023

ÍNDICE

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	4
RESUMO MARCOS & METAS.....	7
AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS.....	8
Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)	8
Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional). 13	
Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional).....	15
Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública).....	17
Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural).....	19
Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)	20
Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	21
Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)	22
Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas).....	23
Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)	25
Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais).....	27

MONITORIZAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Compete à Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE), enquanto órgão de coordenação técnica e de monitorização, designado pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 23/2021/A, de 3 de setembro, elaborar e apresentar aos órgãos de coordenação política e de acompanhamento, relatórios periódicos de monitorização e relatórios anuais de progresso, bem como responder às demais necessidades de informação desses órgãos.

Nestes termos, o cronograma estabelecido para a elaboração dos referidos relatórios é o seguinte:

- Relatórios Periódicos de Monitorização (Trimestrais) – **elaboração até ao último dia do mês seguinte ao final de cada trimestre**, com base exclusivamente nos Relatórios de Progresso (RP) dos Beneficiários Finais (BF), relativos ao ponto de situação dos marcos e metas desse trimestre e dos quatro trimestres seguintes;
 - Nota: os BF elaboram RP trimestrais até ao dia 10 do mês seguinte ao final de trimestre.
- Relatórios Anuais de Progresso – **elaboração até ao final de fevereiro do ano seguinte**, relativos a aspetos globais da gestão e da execução do PRR-Açores, incluindo, entre outras, questões relativas a ações de acompanhamento e auditoria; combate à corrupção, fraude, duplo financiamento e segregação de funções; princípio de não prejudicar significativamente o ambiente (DNSH) e estratégia de comunicação.

O primeiro Relatório Periódico de Monitorização, relativo ao 4.ºT 2021, foi incluído no Relatório Anual de Progresso de 2021.

Os segundo, terceiro e quarto Relatórios Periódicos de Monitorização, relativos, respetivamente, ao 1.ºT, 2.ºT e 3.ºT de 2022, foram elaborados dentro dos prazos previstos.

À semelhança dos anteriores, este Relatório Periódico de Monitorização tem por base a informação inserida no Sistema de Informação do PRR pelos BF, durante o mês de janeiro de 2023, relativa ao quarto Relatório de Progresso Trimestral de 2022, referente aos onze investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência para os Açores.

Em termos da terminologia utilizada para a caracterização do “Estado” dos Marcos e Metas, a Estrutura de Missão Recuperação Portugal (EMRP) alterou, no Sistema de Informação do PRR (SI PRR), a designação “Cumprido” e “Não Cumprido” para “Completo” e “Não Completo”, em consonância com a terminologia utilizada pela Comissão Europeia no seu sistema de informação, FENIX, no qual os Estados Membros reportam os pontos de situação dos Marcos e Metas, com a designação “Completed” e “Not Completed”.

O período de incidência reporta-se ao 4.º Trimestre de 2022, com uma análise que recai também sobre os Marcos e Metas do Grupo B e C considerados “Não Completos” nos trimestres anteriores, e uma análise sobre os Marcos e Metas dos Grupo A, B e C a cumprir nos quatro trimestres seguintes.

Com base nas evidências dos indicadores dos Marcos e Metas a atingir, apresentadas pelos BF, que incluem o prazo definido e os mecanismos de verificação constantes no [Acordo Operacional](#), o estado dos Marcos e Metas é classificado como “Completo” ou “Não Completo”, no que se refere aos Marcos e Metas do trimestre em análise no Relatório de Progresso e dos trimestres

anteriores, e é classificado como “Dentro do Prazo” ou “Atrasado” para os Marcos e Metas dos quatro trimestres seguintes.

Independentemente da situação em que se encontrem os Marcos e Metas, o Beneficiário Intermediário (DRPFE), tendo por base a informação/evidências/dificuldades apresentadas, avalia se as mesmas são suficientes para garantir o seu pleno cumprimento, e que se traduz numa avaliação Favorável (●), Condicionada (●) ou Crítica (●).

Os marcos e metas do Grupo A, denominadas de “desembolso”, são aqueles cujo seu cumprimento viabiliza, por parte da Comissão Europeia, os pedidos de pagamento efetuados pelo Estado Membro e, como tal, o seu cumprimento deverá ser rigoroso, tanto na sua dimensão quantitativa, como qualitativa e temporal, cumprindo plenamente os objetivos que pretendiam alcançar e os requisitos contratuais e ambientais.

Os marcos e metas do Grupo B, funcionam como indicadores de monitorização do estado de execução dos investimentos, cujo cumprimento permite garantir o alcance dos marcos e metas do Grupo A, servindo de alerta na eventualidade de não serem cumpridos no calendário previamente definido.

Os marcos e metas do Grupo C, constantes do anexo II do [Acordo Operacional](#), definidos pela Comissão Europeia, funcionam como indicadores de monitorização associados a algumas metas do Grupo A, cuja monitorização será acompanhada adicionalmente nos prazos estabelecidos e, em alguns casos, são coincidentes com marcos e metas do Grupo B.

A análise neste Relatório Periódico de Monitorização incidiu sobre o nível de execução de 91 Marcos e Metas, deste trimestre e dos quatro trimestres seguintes, incluindo as não cumpridas em trimestres anteriores, com a distribuição temporal expressa na Tabela 1.

Tabela 1: Número de Marcos e Metas - RP 4º T. 2022

Metas	2021	1T 22	2T 22	3T 22	4T 22	1T 23	2T 23	3T 23	4T 23	Total
Grupo A	-	-	-	-	2	-	1	-	3	6
Grupo B	6	6	3	3	14	8	1	13	16	70
Grupo C	-	2	-	1	3	1	1	-	7	15
Total	6	8	3	4	19	9	3	13	26	91

Neste Relatório Periódico de Monitorização procede-se também a uma análise relacionada com os Marcos e Metas anteriormente cumpridos anteriormente, conforme consta na Tabela 2 e nas tabelas subsequentes de análise individual dos investimentos.

Tabela 2: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022, com acumulado dos cumpridos

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
6	Grupo A	1	1	1	3	6	12
39	Grupo B	9	13	25	23	70	109
3	Grupo C	1	4	5	5	15	18
48*	Total	11*	18	31*	31	91	139

* correspondem ao conjunto de marcos e metas a cumprir até ao 4.ºT de 2022 (48+11+31=90)

Assim, sublinhando a maior concentração de marcos e metas nos últimos trimestres de cada ano, constata-se que já foram cumpridos 65% dos 90 marcos e metas dos Grupos A, B e C a concluir até ao final do 4.ºT de 2022, o que representa um bom nível de execução global dos investimentos do PRR-Açores.

Numa análise mais pormenorizada do período em referência, no 4.ºT de 2022 estavam previstos dois marcos de Grupo A. Foi cumprido o marco relativo ao investimento C20-i02-RAA (Educação Digital), e não foi cumprido o marco relativo ao investimento C10-i04-RAA (Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"), como resultado da não adjudicação do respetivo procedimento de contratação pública, pelo facto de o concurso público ter ficado deserto.

Para o 2.ºT 2023 está previsto um marco de Grupo A que se encontra dentro do prazo, e para o 4.ºT 2023 estão previstos três marcos de Grupo A, no estado "Atrasado", e, como tal, serão acompanhados e monitorizados com maior proximidade e pormenor.

Sobre os Marcos e Metas do Grupo B, nove foram cumpridos e treze estão dentro do prazo, verificando-se vinte e cinco não cumpridos e vinte e três atrasados. No que concerne aos Marcos e Metas do Grupo C, um foi cumprido, quatro estão dentro do prazo, verificando-se cinco não cumpridos, cinco atrasados.

Dos seis Marcos e Metas do Grupos B que transitaram de 2021 como não cumpridos, dois foram cumpridos neste período. Relativamente aos oito Marcos e Metas dos Grupos B e C que transitaram do 1.ºT 2022, dois foram cumpridos.

Continuam a verificar-se alguns constrangimentos que condicionam ou implicam algum atraso em certas medidas, essencialmente relacionados com fatores externos, como o aumento de preços, a falta de mão-de-obra, de matérias-primas ou de bens e serviços, que já se vinham a verificar na crise pandémica, mas agora agravados com os efeitos do conflito militar na Europa.

É no contexto destes constrangimentos que resulta a avaliação expressa nos anexos que se seguem, enquanto decorre um processo de reprogramação do PRR, incidindo sobre os Marcos e Metas do Grupo A, em função de dois critérios estabelecidos pela Comissão Europeia: fatores externos relacionados com a guerra e a inflação e correção pontual de textos iniciais, em ambos os casos devidamente fundamentados e evidenciados.



RESUMO MARCOS & METAS

Resumo 5º RP - 4ºT 2022

TOTAL

91

Investimento	Marcos & Metas			Não completo/Atrasado	Completo/Dentro do prazo
	2021	2022	2023		
C01-i08-RAA	3	19	18	36	4
C02-i04-RAA	0	2	2	4	
C03-i04-RAA	1	3	4	5	3
C05-i04-RAA	0	1	1	1	1
C05-i05-RAA	0	0	1	1	
C06-i05-RAA	1	2	2	5	
C07-i05-RAA	0	0	2	2	
C10-i04-RAA	0	1	2	2	1
C14-i03-RAA	1	3	5	6	3
C19-i06-RAA	0	0	11	3	8
C20-i02-RAA	0	3	3	6	
Total Geral	6	34	51	62	29

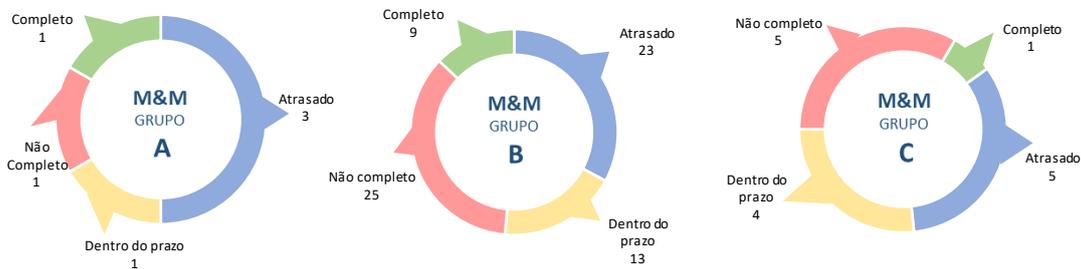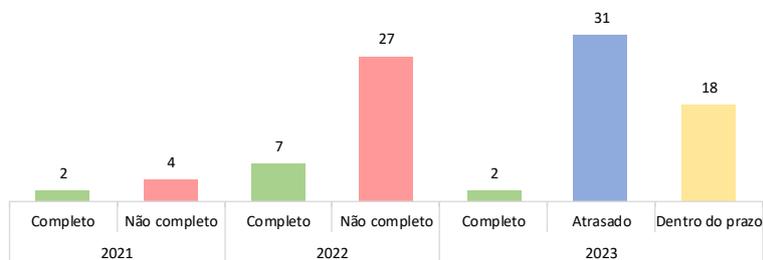

Completo	Dentro do prazo	Atrasado	Não completo	
4	0	17	19	C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
0	0	2	2	C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores
1	2	2	3	C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA)
0	1	0	1	C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
0	1	0	0	C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana
0	0	2	3	C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA
0	2	0	0	C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores
0	1	1	1	C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"
2	1	4	2	C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores
1	7	3	0	C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA
3	3	0	0	C20-i02-RAA - Educação digital (Açores)

AVALIAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS MARCOS E METAS

Investimento C01-i08-RAA - Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores
 (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Saúde e Desporto)

Tabela 3: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
15	Grupo B	4	-	17	16	37	52
-	Grupo C	-	-	2	1	3	3
15	Total	4	0	19	17	40	55

Tabela 4: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
218	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	3.ºT 2021	B	C	4.ºT 2022	●
181	Garantir a implementação e interligação 2 sistemas: Nascer Utente/Notícia Nascimento; Programa e-vacinas	N.º	2	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
257	Assegurar a aquisição de 30% equipamentos informáticos	%	30	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
1.36.1	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	C	NC	1.ºT 2025	●
187	Mapeamento de todos os requisitos de interoperabilidade de sistemas; Aprovação do caderno de requisitos funcionais e técnicos da solução tecnológica a desenvolver	N.º	1	1.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
210	Uniformização dos artigos referente à implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2023	●
219	Implementação, desenvolvimento e testes no	-	-	1.ºT 2022	B	C	4.ºT 2022	●

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
	âmbito da implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS.							
222	Lançamento do procedimento de contratação pública para aquisição de equipamento de videochamada para o Serviço Regional de Saúde, na utilização das tecnologias digitais de apoio à telemedicina	-	-	1.ºT 2022	B	C	4.ºT 2022	●
227	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas produtoras de imagem)	-	-	1.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2023	●
247	Lançamento do procedimento concursal no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	1.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
195	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de consolidação financeira do SRS, do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	2.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
204	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de gestão de recursos humanos	-	-	2.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
211	Lançamento de procedimento de contratação pública para sistema de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	2.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
196	Levantamento dos requisitos para integração no Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	-	-	3.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2024	●
212	Desenvolvimento e testes para implementação de um sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais EPER.	-	-	3.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
1.37.1	Introdução de consultas de telemedicina no Serviço Regional de Saúde dos Açores	N.º	100	3.ºT 2022	C	NC	1.ºT 2024	●

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
240	Lançamento do procedimento concursal para implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	3.ºT 2022	B	NC	2.ºT 2023	●
197	Entrada em produção do sistema de consolidação financeira do sistema de gestão de equipamentos e do sistema de gestão de qualidade	-	-	4.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2024	●
220	Entrada em produção do sistema de evacuações e emergências do SRS.	-	-	4.ºT 2022	B	NC	1.ºT 2024	●
248	Desenvolvimento e testes no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	-	-	4.ºT 2022	B	NC	3.ºT 2024	●
255	Assegurar a aquisição de 75% equipamentos hospitalares	%	75	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
258	Assegurar a aquisição de 60% equipamentos informáticos	%	60	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
1.36.3	Lançamento de procedimento de contratação pública para desenvolvimento do Portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação	-	-	1.ºT 2023	C	A	4.ºT 2024	●
205	Entrada em produção de um sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos dos Hospitais EPER.	-	-	1.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
216	Implementação de alterações no sistema de evacuações e emergências do SRS	N.º	1	1.ºT 2023	B	A	2.ºT 2024	●
241	Desenvolvimento e testes para implementação de upgrade do sistema de cuidados de saúde primários	-	-	1.ºT 2023	B	A	2.ºT 2024	●
249	Entrada em produção de um sistema no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	1	1.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
250	Entrada em produção de dois sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	2	2.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
183	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal dos utentes	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	3.ºT 2024	●

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
188	Desenvolvimento e testes da solução tecnológica de suporte ao portal do Profissional de Saúde	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
206	Formação e Projeto-piloto do sistema de Informação Integrado de Gestão de RH dos Hospitais EPER			3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
224	Realização de consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde	N.º	500	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
228	Desenvolvimento e testes no âmbito da integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica / laboratório/áreas produtoras de imagem)			3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
251	Entrada em produção de três sistemas no âmbito da interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de informação	N.º	3	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2025	●
199	Entrada em produção do Portal	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2026	●
207	Entrada em produção.	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2026	●
229	Entrada em produção da integração de anatomia patológica;	-	-	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
235	Desmaterialização de 3 valências de MCDT's	N.º	3	4.ºT 2023	B	C	4.ºT 2022	●
242	Entrada em produção por módulos.	-	-	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
256	Assegurar a aquisição de equipamentos informáticos de acordo com o levantamento das necessidades.	%	100	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

- A execução encontra-se avaliada em “Condicionada” em 62,5% dos marcos e metas, quando no anterior trimestre a avaliação “Condicionada” se cifrava em 47%.
- A justificação dada pelo Beneficiário Final, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto, centra-se na dificuldade na obtenção de matérias-primas e bens no mercado mundial, relacionada com os processos de digitalização, assim como com nas especificidades e complexidade de alguns dos sistemas a implementar.

Dos 4 marcos que classificados como não cumpridos em 2021, foi cumprido 1 neste 4.º T de 2022. Dos 7 marcos classificados como não cumpridos no 1.º T de 2022, 2 foram cumpridos durante o 4.º T de 2022, verificando-se que 1 marco cujo prazo contratualizado é o 4ºT 2023, foi antecipado, tendo sido cumprido até 4º T 2022.

● Crítica

- A execução encontra-se avaliada em “Crítica” em 17,50% dos marcos e metas, quando no anterior trimestre a avaliação “Crítica” se cifrava em 42%, o que significa que houve desagravamento da avaliação de “Crítica” para “Condicionada”;
- A maioria da avaliação “Crítica”, e até mesmo “Condicionada”, justifica-se pela ausência de evidências, facultadas pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, que demonstrem que os marcos e metas venham a ser cumpridos nos prazos previstos.

Investimento C02-i04-RAA - Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 5: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	2	2	4
-	Grupo B	-	-	2	0	2	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	-	-	2	2	4	6

Tabela 6: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
358	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - construção de edifícios	N.º	36	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
359	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	N.º	132	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
360	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – construção de edifícios	N.º	70	4.ºT 2023	A	A	4.ºT 2025	●
361	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores – renovação	N.º	318	4.ºT 2023	A	A	4.ºT 2025	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

O Plano pormenorizado, apresentado pela Direção Regional da Habitação, para ultrapassar os constrangimentos na execução do investimento, tem vindo a ser objeto de um acompanhamento e de uma monitorização constantes.

Os constrangimentos externos, nomeadamente no que concerne a disponibilidade de mão-de-obra e matérias-primas, principalmente as relacionadas com a eficiência energética, continuam a condicionar significativamente a execução do investimento, quer ao nível de preços, quer ao nível de prazos, o que dificulta o cumprimento dos marcos e metas.

No âmbito do processo de reprogramação do PRR, dirigido para as correções necessárias decorrentes desta situação em particular, o Beneficiário Final apresentou um plano atualizado.

Relativamente à construção de edifícios, estão a decorrer 20 procedimentos, dos quais 3 se referem a projetos de infraestruturas, 2 a concursos para execução de infraestruturas, 12 a elaboração/revisão de projetos e 3 a empreitadas de construção de moradias.

Além disso pretende-se lançar, até final de maio de 2023, os concursos para construção das 19 moradias que se prevê concluir em 2024. Os restantes concursos, devidamente identificados, serão lançados ao longo do ano de 2023, contudo, a conclusão das obras só deverá ocorrer em 2025.

Quanto à renovação de edifícios, estão em curso 16 procedimentos, dos quais 11 se referem à elaboração de projetos e 5 a empreitadas.

Perante este cenário, a avaliação encontra-se “Condicionada”.

Investimento C03-i04-RAA - Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) (Beneficiário Final – Vice-Presidência do Governo Regional)

Tabela 7: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
1	Grupo B	1	1	3	2	7	8
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
1	Total	1	2	3	2	8	9

Tabela 8: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
443	Viaturas adquiridas	N.º	26	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
437	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	128	4.ºT 2022	B	C	-	●
441	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	20	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
444	Viaturas adquiridas	N.º	46	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2024	●
442	Novas vagas para pessoas com deficiência em Centros de Atividades Ocupacionais	N.º	80	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
438	Novas vagas para crianças em creches e redes de amas	N.º	312	4.ºT 2023	B	DP	-	●
445	Viaturas adquiridas	N.º	66	4.ºT 2023	B	A	4.ºT 2024	●
3.16.1	Relatório sobre os progressos alcançados na consecução da meta 3.16, apresentando informações sobre: i) o número de crianças abrangidas pela isenção de pagamento de mensalidades de infantários; ii) o número de crianças e jovens apoiados através da criação de pontos de apoio ao estudo; iii) o número de estudantes do ensino superior apoiados; o número de novas vagas para crianças em creches e na rede de amas.	-	-	4.ºT 2023	C	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informações complementares:

443 e 444:

- O número de viaturas aprovadas nas candidaturas apresentadas no âmbito do Programa “Gerações em Movimento” já ultrapassa a meta estabelecida para o final de 2023:
 - Edições anteriores aos avisos, foram aprovadas 10 viaturas;
 - 1ª Fase – [Aviso n.º 2/C03-i04/2022](#), publicado a 06/01/2022, com uma dotação global de 1,5 M€, tendo sido aprovadas 41 viaturas;
 - 2ª Fase – [Aviso n.º 4/C03-i04/2022](#), publicado a 30/06/2022, com uma dotação global de 1,2 M€, tendo sido aprovadas 30 viaturas.
- Continuam a verificar-se constrangimentos externos, nomeadamente no que respeita aos prazos de entrega por parte dos fornecedores, dada a escassez no mercado de alguns componentes necessários à produção, aliada à elevada e crescente procura de viaturas elétricas por toda a Europa. No entanto, são fortes as evidências que no final da execução do PRR, o objetivo será cumprido, pelo que a avaliação é favorável.

● Condicionada

441:

- Antecipam-se constrangimentos no que respeita à construção/remodelação de novos equipamentos, dada a escassez de mão-de-obra, materiais de construção e consequente subida de preços e aumento dos custos, agravada pela condição arquipelágica da Região, podendo também verificar-se algum atraso nos processos de contratação pública. Face à programação temporal das obras em questão, apenas existem condições para disponibilização de novas vagas no decorrer do 2º semestre de 2024. No entanto, já se encontra aprovada uma Resolução do Conselho do Governo que autoriza a celebração de um contrato de cooperação-valor investimento entre o Governo Regional e a Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa, com o objetivo de assegurar a execução de obra para a construção de um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e de um Lar Residencial, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Lagoa, correspondendo a 30 vagas no CACI e 18 vagas no Lar Residencial. O projeto de construção de Centro de Dia especializado e ATL nas Lajes das Flores está em fase de licenciamento, tendo o pedido de licenciamento sido entregue na respetiva Câmara Municipal. No processo da obra relativa à adaptação de imóvel para Lar residencial em Santa Maria foi adquirido o imóvel em 2021 e decorrem os procedimentos de contratação pública para a elaboração do respetivo projeto. As restantes obras previstas mantêm a sua calendarização, estando em fase de estudo prévio.

Investimento C05-i04-RAA - Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 9: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
2	Grupo A	-	-	-	-	-	2
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
1	Grupo C	-	1	1	-	2	3
4	Total	-	1	1	-	2	6

Tabela 10: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
5.17.2	Desenvolvimento e adoção, por parte do gestor do veículo, de pelo menos dois programas de investimento no total. Os programas de investimento devem ser desenvolvidos e adotados pelo BPF, organismo de gestão do veículo, e, no quadro estabelecido pela política de investimento, devem descrever a finalidade e a dimensão indicativa do programa, enumerar os instrumentos financeiros que podem aplicar, pormenorizar os critérios de seleção / elegibilidade para as empresas apoiadas e especificar os objetivos de investimento e retornos visados	-	-	1.ºT 2022	C	NC	1.ºT 2023	●
5.17.4	Apresentação de um relatório anual que comprove a entrega de um total de 50 000 000 EUR às empresas não financeiras da região em apoio de capital e quase capital, em conformidade com a política de investimento do instrumento, incluindo informações sobre: investimentos efetuados para cada tipo de programa de investimento, taxas de rendibilidade esperadas, custos administrativos	-	-	4.ºT 2023	C	DP	-	●

suportados, eventuais
alienações, reembolsos e
conversões em
subvenções.

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

5.17.2:

- Encontra-se parcialmente cumprido, com a implementação em curso do primeiro instrumento, estando a decorrer o processo de preparação de um segundo instrumento, o qual teve uma evolução bastante positiva no final de 2022. Aguarda-se a finalização e publicação do Aviso do novo instrumento, com verbas do FCEA, para promover a recapitalização de PME nos Açores, através de empréstimos participativos ou instrumento similar, com o envolvimento de bancos comerciais, estando prevista a implementação deste instrumento até ao final do primeiro trimestre de 2023, pelo que a avaliação passou ao estado “Condicionada”.

Investimento C05-i05-RAA - Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural)

Tabela 11: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	-	-	-	-	1
1	Grupo B	-	1	-	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	-	1	-	-	1	3

Tabela 12: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
599	Ilhas com sistema de avisos agrícolas	N.º	2	4.ºT 2023	B	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informação complementar:

599:

- Prevê-se a realização do concurso público para desenvolvimento de uma “rede de monitorização e avisos agrícolas ao nível de ilha” no 1.º trimestre de 2023;
- De acordo com a calendarização dos trabalhos, a emissão de avisos agrícolas nas ilhas de São Miguel e Terceira iniciar-se-á no 3.º trimestre de 2023, dando cumprimento à meta estabelecida.

Investimento C06-i05-RAA - Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego)

Tabela 13: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
-	Grupo B	-	-	3	-	3	3
-	Grupo C	-	-	-	2	2	2
-	Total	-	-	3	2	5	5

Tabela 14: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
651	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	260	4.ºT 2021	B	NC	4.ºT 2023	●
652	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	520	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
656	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	3	4.ºT 2022	B	NC	4.ºT 2023	●
6.10.1	Número adicional de adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior na Região Autónoma dos Açores	N.º	780	4.ºT 2023	C	A	(não definido)	●
6.11.1	Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	N.º	7	4.ºT 2023	C	A	(não definido)	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condiçãoada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Este investimento continua a revelar um atraso considerável, que poderá pôr em causa o alcance das Metas A contratualizadas. Tem vindo a ser encetadas diligências por parte do BI (DRPFE) junto do BF (Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego), promovendo uma análise conjunta das dificuldades e formas de ultrapassar os constrangimentos atuais.

A proposta de reprogramação do PRR procurará dar um novo rumo à execução do investimento.

Investimento C07-i05-RAA - Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 15: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
1	Grupo A	-	1	-	-	1	2
1	Grupo B	-	1	-	-	1	2
-	Grupo C	-	-	-	-	-	-
2	Total	-	2	-	-	2	4

Tabela 16: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
713	Último Projeto técnico rodoviário concluído (todos os projetos concluídos)	-	-	1.ºT 2023	B	DP	-	●
714	Contrato assinado para 8 projetos rodoviários	-	-	2.ºT 2023	A	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

713:

- Encontram-se concluídos 9 projetos de execução rodoviários - Melhoria da acessibilidade Furnas/Povoação - 1º Lanço - Variante Furnas; Variante Portal do Vento; Variante de São Roque; Variante à Madalena na Ilha do Pico; Ligação entre a ER 3-2ª e ER4-2ª na Graciosa e Variante à cidade da Horta 2ª fase; Variante a Vila do Porto, Transversal de São Jorge e Ligação entre a Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra.
- O último projeto – Variante a Capelas - está em fase de execução, no entanto, foi concedida uma prorrogação para a sua entrega que deverá ser efetivada após 31 de março de 2023, registando-se, assim, um possível atraso no cumprimento do marco.

Informações complementares:

714:

- Estão assinados 3 contratos, Variante ao Portal do Vento, Variante às Furnas e Variante a S. Roque, prevendo-se, até 30 de junho, assinar os contratos de Variante a Madalena, Variante a Horta - 2ª fase, Ligação entre a E.R. nº 3-2ª e a E.R. nº 4-2ª, Variante a Vila do Porto e Transversal de S. Jorge.
- Foram lançados os concursos públicos para as empreitadas: Ligação entre a E.R.3-2ª e a E.R.4-2ª (Graciosa), Circular à Vila da Madalena (Pico); Variante à Cidade da Horta (Faial) e Transversal a S. Jorge.

Investimento C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Mar e das Pescas)

Tabela 17: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	1	-	1	1
1	Grupo B	-	-	-	-	-	1
2	Grupo C	-	1	-	1	2	4
3	Total	-	1	1	1	3	6

Tabela 18: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
940	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC	-	-	4.ºT 2022	A	NC	3.ºT 2023	●
10.9.2	Início da Construção e armamento do navio de investigação	-	-	2.ºT 2023	C	DP	-	●
10.10.1	Pelo menos 50% da execução da Empreitada	-	-	4.ºT 2023	C	A	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Crítica

940 e 10.10.1:

- Por ausência de apresentação de propostas, justificada pela insuficiência do preço base, foi determinada a não adjudicação do procedimento de contratação pública do Concurso Público n.º 7/DRP/2022 para a celebração do Contrato de “Empreitada do Tecnopolo – Martec - PRR”. Estão a ser analisadas alternativas a apresentar à Comissão Europeia.
- O atraso verificado na execução do marco 940, impossibilita a concretização atempada do marco 10.10.1.

Informação complementar:

10.9.2:

- O prazo para apresentação de candidatura para a celebração do contrato de “Aquisição de um Navio de Investigação para A Região Autónoma dos Açores - PRR” terminou a 18 de janeiro de 2023. Estima-se que até ao final de junho de 2023 se inicie a construção e armamento do navio de investigação.

Investimento C14-i03-RAA - Transição Energética nos Açores (Beneficiário Final – Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas)

Tabela 19: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	1	1	1
4	Grupo B	2	1	-	2	5	9
-	Grupo C	-	-	2	1	3	3
4	Total	2	1	2	4	9	13

Tabela 20: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1057	Conclusão dos Cadernos de Encargos do PF e PE no Corvo	-	-	4.ºT 2021	B	C	4.ºT 2022	●
14.11.2	Conclusão dos ensaios nos poços	-	-	4.ºT 2022	C	NC	4.ºT 2023	●
1058	Início das obras do PF e do PE – ilha Corvo	-	-	4.ºT 2022	B	C	-	●
14.13.1	Novos sistemas de armazenamento de energia com baterias e sistemas de gestão de energia na RAA: início das obras nas ilhas do Faial, das Flores e do Corvo	-	-	4.ºT 2022	C	NC	4.ºT 2023	●
397	Produção adicional de eletricidade renovável no Corvo	kW	850	3.ºT 2023	A	A	2.ºT 2024	●
1059	Conclusão das obras do PF e PE	-	-	3.ºT 2023	B	A	2.ºT 2024	●
1063	Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico	-	-	4.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
1067	Aumento da capacidade instalada em, pelo menos, 3,3 MW	MW	3.3	4.ºT 2023	B	DP	-	●
14.11.3	Contratação da instalação de novos grupos CGPV e CGPA	-	-	4.ºT 2023	C	A	3.ºT 2024	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

14.11.2:

- Os ensaios de produção dos Poços CL8, PA5, PA6 e PA7 encontram-se em curso desde julho de 2022. Contudo, estes poços tendem a exibir um comportamento distinto dos

anteriores, nesta medida, os trabalhos inerentes aos ensaios de produção dos Poços CL8, PA5, PA6 e PA7 estão a ser mais exigentes, atrasando o seu início.

14.13.1:

- A 07/11/2022 terminou o prazo para a entrega de propostas relativo ao concurso público internacional para o "Contrato de conceção, construção, fornecimento, montagem, ensaios, entrada em serviço e garantia dos Sistemas de Armazenamento de Energia e Sistema de Gestão para as Ilhas Faial, Flores e Corvo". Foi decidida a não adjudicação das propostas apresentadas ao procedimento, e, em 16/12/2022, autorizada abertura de novo procedimento concursal cuja publicação deverá ocorrer a breve trecho.

397 e 1059:

- O auto de consignação da empreitada de Fornecimento de Aerogeradores para o Parque Eólico do Corvo (marco 1058), ocorreu a 7 de novembro de 2022. Pese embora tenha sido adjudicado dentro do prazo estipulado, o contrato tem duração de execução de 18 meses, pelo que a conclusão das obras do Parque Eólico apenas ocorrerá no segundo trimestre de 2024, atendendo também à complexidade e dimensão da operação logística em causa, em virtude de se realizar na ilha do Corvo.

1063:

- Está em curso o estudo de dimensionamento e viabilidade técnica dos Sistemas de Armazenamento de Energia para a ilha do Pico, prevendo-se a sua conclusão em junho de 2023;
- Estima-se que o lançamento do concurso público internacional para a instalação dos Sistemas de Armazenamento de Energia para as ilhas de São Jorge e Pico ocorra durante o 4.º trimestre de 2023.

14.11.3:

- A conclusão das especificações técnicas do Cadernos de Encargos que suportará a contratação do novo grupo da CGPA, necessita da caracterização da energia primária disponível nos poços geotérmicos que serão avaliados até ao final de 2023 (marco 14.11.2);
- Deste modo, prevê-se a contratualização da aquisição dos equipamentos da CGPV no 4º trimestre de 2023 e da CGPA no 3º trimestre de 2024.

Informação complementar:

1058:

- A 7/11/2022 foi assinado o auto de consignação da empreitada de Fornecimento de Aerogeradores para o Parque Eólico do Corvo, com prazo de execução dos trabalhos de 18 meses;
- A 9/11/2022 foi assinado o auto de consignação da empreitada de construção civil do Parque Fotovoltaico;
- A 21/12/2022 foi assinado o Auto de Consignação referente ao fornecimento e montagem de painéis solares, inversores, cabos e estruturas do Parque Eólico da ilha do Corvo.

Investimento C19-i06-RAA - Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA (Beneficiário Final – Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública)

Tabela 21: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	-	-	-	-	-	-
13	Grupo B	1	6	-	3	10	23
-	Grupo C	-	1	-	-	1	1
13	Total	1	7	-	3	11	24

Tabela 22: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1433	Aprovação do caderno de especificação de requisitos para o desenvolvimento do Novo Portal de Serviços da APR (frontoffice e backoffice)	N.º	1	1.ºT 2023	B	A	3.ºT 2023	●
1438	Consulta preliminar ao mercado para identificação de soluções e opções tecnológicas	N.º	1	1.ºT 2023	B	DP	-	●
1446	Entrega de Manual de Cibersegurança para utilizadores da APR	N.º	1	1.ºT 2023	B	C	-	●
1422	Lançamento de projeto-piloto com posto móvel de atendimento ao cidadão	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	3.ºT 2024	●
1428	Aprovação do caderno de especificação de requisitos funcionais e técnicos para implementar o roll-out da plataforma de interoperabilidade eHUB-RAA baseada em FLOSS	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1434	Entrega do produto mínimo viável para o Simulador de serviços transacionais e online com 3 serviços disponíveis	N.º	3	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1439	Lançamento de procedimento de contratação pública para o fornecimento da plataforma tecnológica	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
1447	Fornecimento e instalação de plataforma SIEM (Information and Event Management) e solução de análise de tráfego para suportar o Centro de Operações de	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●

Cibersegurança (SOC) - Azores_Ciber360								
1453	Entrada em produção do Sistema Integrado de Gestão da Formação da Administração Pública Regional	N.º	1	3.ºT 2023	B	A	1.ºT 2024	●
1458	Formação de, até 100, trabalhadores da Administração Pública Regional em metodologias de desenho de serviços públicos	N.º	1	3.ºT 2023	B	DP	-	●
19.18.1	Relatório sobre a execução dos projetos: - APR+ Acessível, Inclusiva e Aberta - APR+ Serviços mais ágeis - APR+ Proativa - Portal móvel para a administração pública regional - APR+ Apta para o futuro	-	-	4.ºT 2023	C	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

● Condicionada

1433:

- A Direção Regional das Comunicações e da Transição Digital está a reunir elementos e especificidades técnicas para avaliar soluções de mercado nesta área que cumpram os requisitos de integração com todo o ecossistema. No entanto, e atendendo à complexidade da solução e às suas especificações técnicas, conjugando com o impacto da conjuntura atual, existe o risco de atraso no cumprimento desta meta.

1453:

- A publicação do procedimento de contratação pública ocorreu a 17 de outubro de 2022. À data de 31/12/2022, encontrava-se concluído o Relatório Preliminar. Prevê-se arranque do projeto em abril de 2023, com duração estimada de implementação de 7 meses, o que implica a disponibilização da operação da plataforma em outubro de 2023, ultrapassando o prazo estabelecido inicialmente.

Informação complementar:

1446:

- Encontra-se concluída a elaboração do manual de cibersegurança, estando atualmente em consolidação para disponibilização.

1422:

- No âmbito deste projeto da RIAC, serão adquiridos 11 postos de atendimento móveis (viaturas elétricas), sendo que até ao 3.ºT 2023 existirão 2 postos móveis de atendimento ao cidadão para prova de conceito. O projeto ficará concluído, até final do 3.ºT 2024, com a disponibilização de uma APP para os cidadãos com os serviços da RIAC.

Investimento C20-i02-RAA - Educação digital (Açores) (Beneficiário Final – Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais)

Tabela 23: Resumo dos Marcos e Metas - RP 4.º T 2022

Completo até 3T 2022	Metas	Completo	Dentro do Prazo	Não Completo	Atrasado	Total RP 4ºT	Total Acumulado
-	Grupo A	1	-	-	-	1	1
2	Grupo B	1	3	-	-	4	6
-	Grupo C	1	-	-	-	1	1
2	Total	3	3	-	-	6	8

Tabela 24: Ponto de situação dos Marcos e Metas

Código	Designação	Unidade de Medida	Objetivo	Prazo Inicial	Grupo	Estado	Prazo Revisto	Avaliação
1568	Cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA	N.º	4	4.ºT 2022	A	C	-	●
1547	Ambientes educativos inovadores	N.º	110	4.ºT 2022	B	C	-	●
20.11.1	Novos computadores portáteis e tablets para escolas na RAA	N.º	11.500	4.ºT 2022	C	C	-	●
1542	Aquisição de equipamentos digitais móveis	N.º	18.000	4.ºT 2023	B	DP	-	●
1546	Ambientes educativos inovadores	N.º	220	4.ºT 2023	B	DP	-	●
1550	Conceção de MOOCs	N.º	8	4.ºT 2023	B	DP	-	●

Legenda:

C: Completo; NC: Não Completo; DP: Dentro do Prazo; A: Atrasado; ●: Favorável; ●: Condicionada; ●: Crítica

- Avaliação do Ponto de Situação dos Marcos e Metas

Informações complementares:

1568:

- Meta A atingida no final de 2022. Foram disponibilizados 4 cursos (MOOCs): “Ferramentas digitais e segurança online”, “Inovação e design thinking” (para Docentes), “Ferramentas digitais de e-mail, videochamada e armazenamento de informação” e “Redes sociais: perigos e cuidados a ter na sua utilização” (para Encarregados de Educação).

1546 e 1547:

- Aquisição de manuais escolares digitais, bens e serviços conexos para o ano escolar de 2022/23. Manuais digitais entregues nas Unidades Orgânicas com 5.º e 8.º ano.
- Painéis interativos – concurso finalizado e adjudicado. Contratos assinados. Equipamentos serão entregues nas escolas durante o mês de janeiro de 2023.

- Equipamentos especializados para sala de aula, como jogos didáticos, impressoras 3D e kits de robótica e de realidade virtual – equipamentos entregues nas escolas.
- Portal de aquisição de competências digitais (para disponibilização dos MOOCs) - finalizado e online.
- Aquisição de uma plataforma com vídeos tutoriais com foco em metodologias ativa - finalizado e disponibilizado.
- Aquisição de Plataforma de Aprendizagem, Colaboração, Partilha e Criação de Recursos Educativos Digitais (REDs) - finalizado e disponibilizado.

1543:

- Foram adquiridos 14.814 equipamentos, nomeadamente:
 - 4.000 computadores e 1.000 tablets em 2021
 - 3.028 computadores e 1.000 tablets em 2022
 - 2.773 tablets e 3.013 Chromebooks Go adquiridos em 2022, no âmbito da aquisição dos manuais digitais

(esta página foi deixada em branco)



GOVERNO
DOS AÇORES



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU
